



სადემონტაჟო გუნგება 1:1200

პიკეტაგითი ადგილმდებარე:

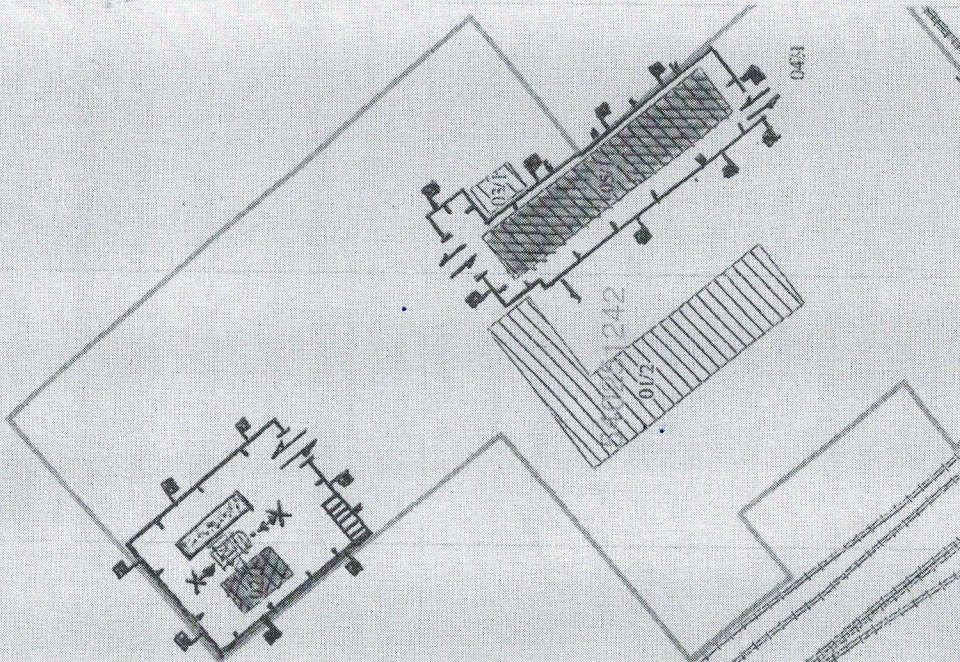

სადავო ნაწილი    სადავო

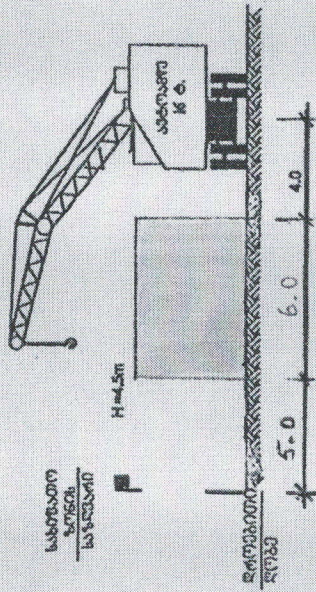

ಪ್ರಗತಿಶೀಲತೆ

1. წინამდებარე ნახაზი „მო-1“ იხილეთ განმარტებით ზანათთან ერთად.
2. წინამდებარე სადემონტაჟო გეგმებმა დამუშავებულია საქვების შენობის და საწყობის დარჩენილი კედლების მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟის პერიოდისთვის.
3. საქვების შენობის დემონტაჟი ხორციელდება სავტომობილო აშწის დახმარებით.
4. ტვირთააშწილობით 16 ტნ. სამუშაოთა წარმოებისას აშწე მოძრაობს შენობის გარეთა მხრიდან, კონტურის გასწვრივ, მიზნით შენობასთან 4.0 მეტრზე.
5. ყველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სნდაწ-III-4-80"-ის და უსაფრთხოების მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების შესაბამისად.
6. აშწის სამოძრაო ზოლი, სასივრთო ზონის რადიუსი და დროებითი ღობის მოწყობის საკითხი დაზუსტდეს უშუალოდ ადგილზე.
7. საწყობის დარჩენილი კედლების დემონტაჟი ხდება დროებითი ხარაჩობის გამოყენებით.

[illegible]
