


სადემონტაჟო გეგმები 8 1:1000

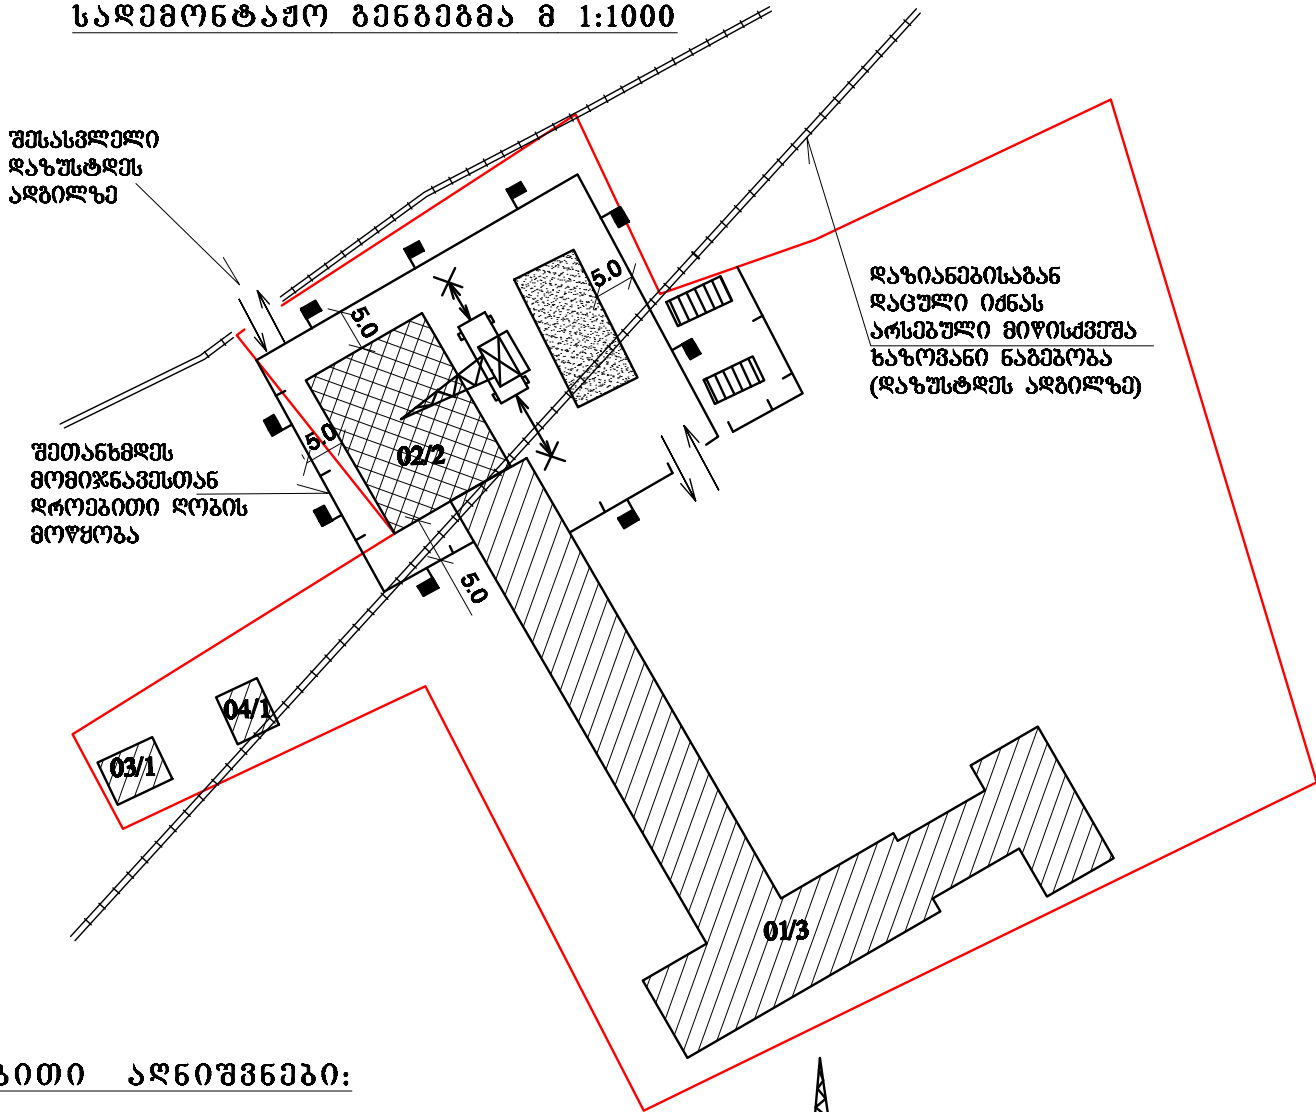


პირობითი აღნიშვნები:

- სკოლის სადემონტაჟო კველი შენობა
- არასადემონტაჟო შენობა
- სკოლის ეზოს საზღვარი (საკადასტრო)
- ღია სასაწყობო მოედანი
- დროებითი შენობები

- საავტომობილო ავტო
- ავტოს სვლის ღერძი
- ავტოს კიდურა ღერძი
- დროებითი ღრუბი
- სახიფათო ზონის საზღვარი
- არსებული ხაზოვანი ნაგებობა

სადემონტაჟო სქემა

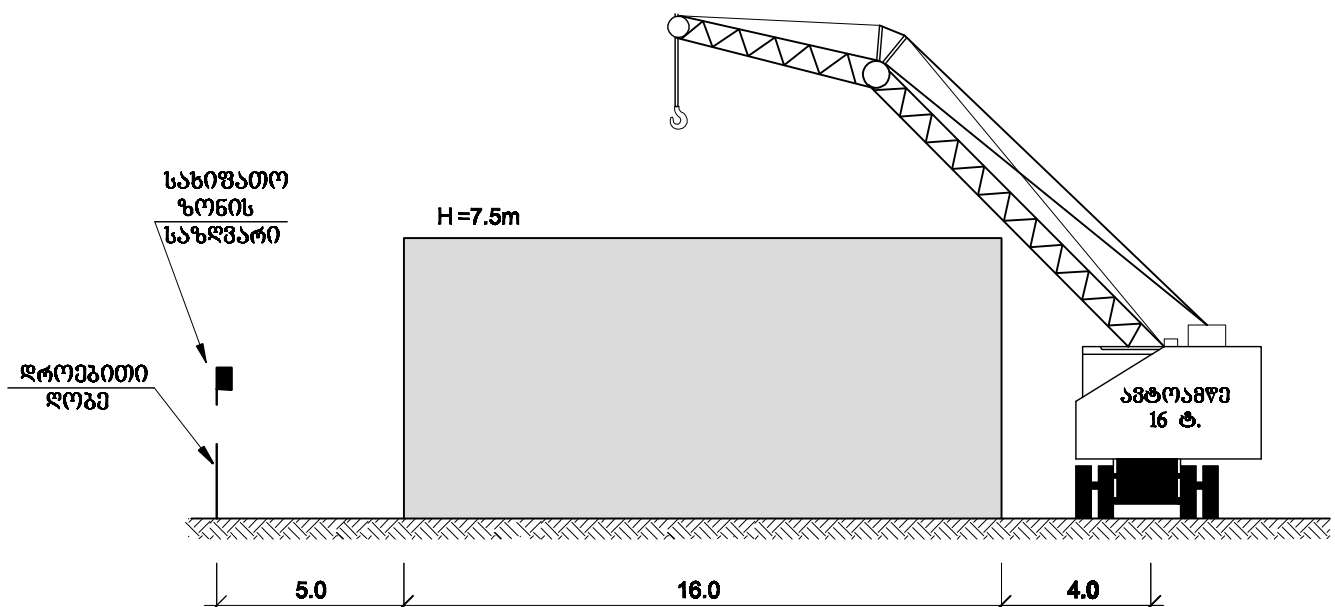

სართულზე სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მიმართულება

შენიშვნები:

- წინამდებარე ნახაზი „მრ-1“ იხილეთ განმარტებით ბარათთან ერთად.
- წინამდებარე სადემონტაჟო გეგმები დაგეგმვების სკოლის სადემონტაჟო კველი შენობის მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟის პერიოდისათვის.
- სკოლის კველი შენობის დემონტაჟი ხორციელდება საავტომობილო ავტოს (ტვირთავებით 16 ტნ) დახმარებით, სამუშაოთა წარმოებისას ავტო მოძრაობის შენობის ბარათს გზიდან, კონტურის ბაზრის, მიგნით შენობასთან 4 მეტრზე.
- სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები მოცემულია განმარტებით ბარათში.
- დემონტაჟის სახიფათო ზონების საზღვრები დაზუსტდეს ადგილზე.
- სახიფათო ზონის დროებითი მავრთულობის დროით შენობაგზის საპითხი დაზუსტდეს ადგილზე.
- სადემონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგიური რეგულირება მოცემულია სამუშაოთა წარმოების კალენდარულ გეგმაში.
- გველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სტანდარტ-4-80-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
- კველი შენობის სადემონტაჟო სამუშაოები იწყება ავტოს მხარეს მდებარე გალიდან (მეთოდ-„აგვიდან სვლა“).

დასახელება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადახლოს №1 საჯარო სკოლის კველი შენობის დემონტაჟი		სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება სადემონტაჟო გეგმები სადემონტაჟო სქემა ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პრემიტი	არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ზურაბ ნიკოლაიშვილი შეასრულა თამარ ხუციშვილი შეამოწმა შატი ბაბიძაშვილი მასშტაბი 1:1000 ნახაზი „მრ-1“ ფურც. №1 სულ ფურც. 1 სტატუსი რევიზია
---	--	--	--	---
