

სადემონტაჟო გეგმებმა მ 1:2000

სადემონტაჟო სქემა
(ინტერნატის საცხოვრებელი)

პირიპირი აღნიშვნები:

- 

სკოლის სადემონტაჟო შენობები
- 

არასადემონტაჟო შენობები
- 

სკოლის ეზოს საზღვარი (საპაღასტრო)
- 

ღია სასაწყობო მოედანი
- 

დროებითი შენობები
- 


საავტომობილო ავზი
- 

ავზის სვლის ღერძი
- 

ავზის კიდეშა ღერძი
- 

დროებითი ღოგე
- 

სახიფათო ზონის საზღვარი

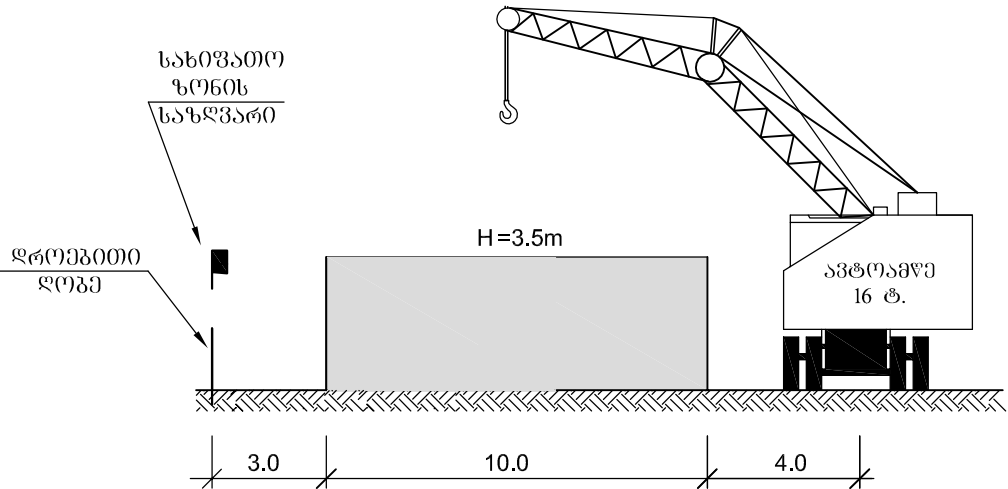

შენიშვნები:

- წინამდებარე ნახაზი „მ-1“ იხილეთ განმარტებით ბარათთან ერთად.
- წინამდებარე სადემონტაჟო გეგმებმა დამუშავებულია სკოლის სადემონტაჟო შენობების მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟის პერიოდისათვის.
- შენობების დემონტაჟი ხორციელდება საავტომობილო ავზის (ტვირთავი 16 ტნ) დახმარებით, საშუალოთა წარმოებისას ავზი მოძრაობს შენობის გარეთა მხრიდან, კონტურის გასწვრივ, მიგმით შენობასთან 4 მეტრზე.
- სადემონტაჟო საშუალოთა წარმოების მიმდინარე მოცემულია განმარტებით ბარათში.
- დემონტაჟის სახიფათო ზონის საზღვრები დაუშტდეს აღბილზე.
- სახიფათო ზონის დროებითი მავრთულგადის ღოგით შემოფარგვლის საკითხი დაუშტდეს აღბილზე.
- სადემონტაჟო საშუალოთა ტექნოლოგიური რიგობრიობა მოცემულია საშუალოთა წარმოების კალენდარულ გეგმაში.
- ქველა სადემონტაჟო საშუალო უნდა შესრულდეს სნდაწ-III-4-80*-ის მოთხოვნების შესაბამისად.

დასახელება უცალტუგოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთის გროწუელას საწარო სკოლის ფარების, აბანოს, ინტერნატის საცხოვრებელის და ჯანდაცვის კუნძტის შენობების დემონტაჟი.		სსიპ  საგანმანათლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.eslda.ge	ნახაზის დასახელება სადემონტაჟო გეგმებმა სადემონტაჟო სქემა ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია სადემონტაჟო საშუალოთა ორგანიზაციის პრემტი	არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ზურაბ ნიკოლაიშვილი შეასრულა თამარ სხილაძე შეამოწმა ფატი ბაბიღაური მასშტაბი 1:2000 ნახაზი „მ-1“ ფურც. №1 სულ ფურც. 1 სტატუსი რევიზია
--	--	--	---	--
