DownloadServlet (3501×2550)

სადემონტაჟო გეგმაგეგმა მ 1: 1000

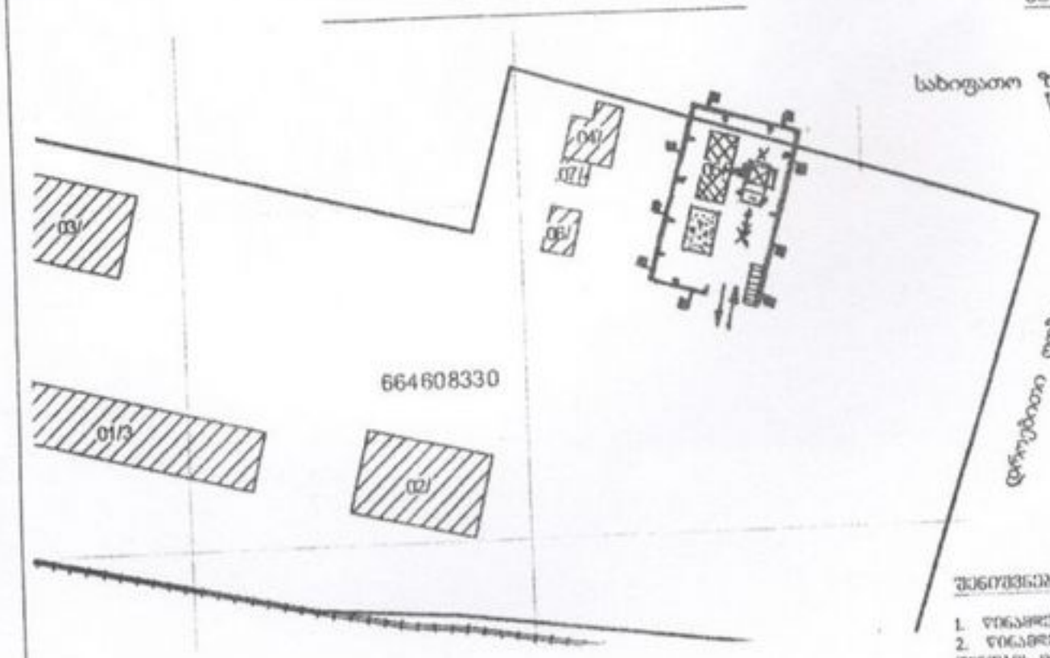

სადემონტაჟო სქემა

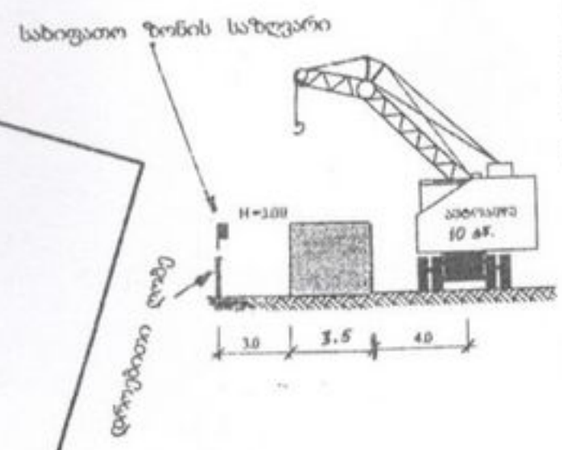

კეთილგანცხადებული აღნიშვნები:

- სკოლის სადემონტაჟო ავტოფარეხი
- არასადემონტაჟო შენობა-ნაგებობები
- სკოლის ეზოს საზღვარი (საამბასტრე)
- ღია სასაწყობო მოედანი
- დროებითი შენობა
- საავტომობილო ამწე
- ამწის სწორი ღერძი
- ამწის კიდურა დგომი
- დროებითი ღობე
- სახიფათო ზონის საზღვარი

შენიშვნები:

1. წინამდებარე ნახაზი „ეს-I" იხილეთ განმარტებითი გაკაფთან ერთად.
2. წინამდებარე სადემონტაჟო გეგმაში დაფიქსირებულია სკოლის ავტოფარეხის შენობის მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟის კეთილმოწყობისათვის.
3. შენობის დემონტაჟი ხორციელდება საავტომობილო ამწის (ტვირთამაწევობით 10 ტონ) დახმარებით, საჭიროების შემთხვევაში ამწე მოთავსდება შენობის გარეთ მხრიდან, კონტეინერის გასწვრივ, მიმდებარე შენობასთან 4 მეტრამდე.
4. სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების მეთოდები მოცემულია განმარტებითი გაკაფთან.
5. დემონტაჟის სახიფათო ზონების საზღვრები დაზუსტდეს ადგილზე.
6. სახიფათო ზონის დროებითი მაფრთხილებელი ლენტით შემოწესებულობის საკითხი დაზუსტდეს ადგილზე.
7. სადემონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგიური რეგლამენტი მოცემულია სამუშაოების წარმოების ჟურნალში.
8. ყველა სადემონტაჟო სამუშაო შეიძლება შესრულდეს სნდაკ-III-4-80*-ის მოთხოვნების შესაბამისად.

დასახელება გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. პატარა გარეჯვარის საჯარო სკოლის ავტოფარეხის შენობის დემონტაჟი		სწავ საგანმანათლებლო და საინოვაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ქ. ალექსიძის 1, ბინა/ოფისი/ბინა №1 II სართული ფოსტის საქართველო 3600 ტ. (+995 32) 2 249 226, 2 260 334, www.eaia.gp	სამუშაოს დასახელება სადემონტაჟო გეგმების სადემონტაჟო სქემა	სამშენებლო-საპროექტო საბჭოს წევრი მ. ჯოღაშვილი შესაბამისი ტარიელ სტეფანა სამუშაოს ეტაპი ტექნიკური დოკუმენტაცია სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი
				მასშტაბი 1:1000 ფურცლის ეტაპი ფურცლის N 1 სულ ფურცლის 1 სტადიის ინდექსი
