სადემონტაჟო გეგმა მ 1:800

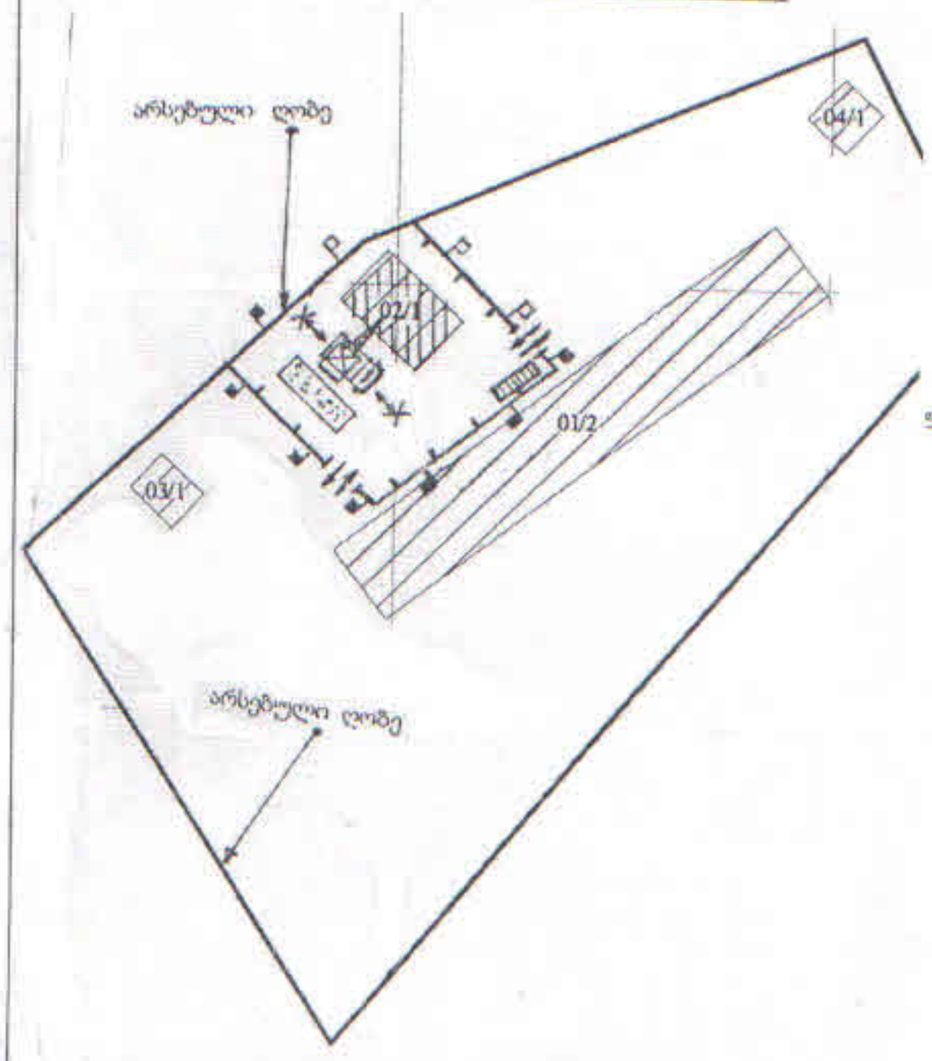

სადემონტაჟო სქემა

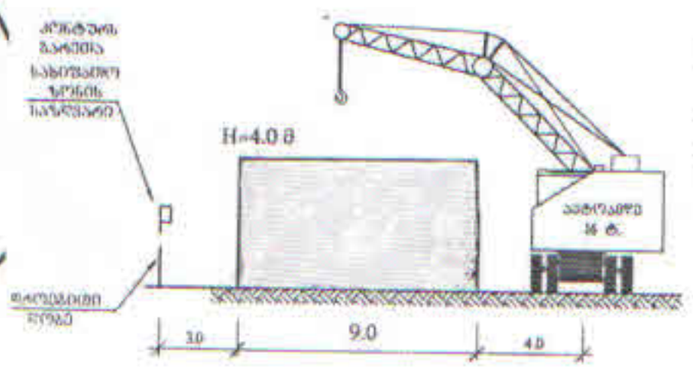

ვერტიკალური ანძები:

- სადემონტაჟო შენობა
- არასადემონტაჟო შენობები
- სარწყავის ფხის სახაზოვანი (საკანალიზაციო)
- ღია სანაწილობო მოედანი
- ზედაპირული წყალსადენი
- საავტომობილო ამწე
- ამწის სვლის ღერძი
- ამწის ძირითა ფეხები
- დროებითი ღობე
- სახიფათო ზონის საზღვარი (კონტეინერით)
- კონტეინერით სახიფათო ზონის საზღვარი

შენიშვნები:

1. წინამდებარე ნახაზი „ᲛᲝ-Ი" ᲘᲜᲓᲘᲕᲘᲓᲘ ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲡᲐᲜ ᲔᲠᲗᲐᲓ.
2. წინამდებარე სადემონტაჟო გეგმით გათვალისწინებულია შენობის მოცულობის ნაწილის დემონტაჟის პროცედურები.
3. შენობის დემონტაჟის პროცედურა საავტომობილო ამწის (ტევადობა-ამწეობით 16 ტნ) დახმარებით, სამუშაოებია წარმოებებისას ამწე მოხერხილა შენობის გარეთა ზღვრიდან, კონტეინერის განთავსების, მისამართ შენობასთან 4 მეტრამდე.
4. სადემონტაჟო სამუშაოებია წარმოების ძველი მოცემულია განმარტებითი ბარათში.
5. დემონტაჟის სახიფათო ზონების საზღვრები დაისმება ადგილზე.
6. სახიფათო ზონის დროებითი გადატანილობის ღირებულება შეიმოწმარგვლის საკითხი დაისმება ადგილზე.
7. სადემონტაჟო სამუშაოებია ტექნოლოგიური რეგლამენტი მოცემულია სამუშაოების წარმოების კალენდარულ გეგმაში.
8. ᲛᲘᲔᲠᲗ ᲡᲐᲓᲔᲛᲝᲜᲢᲐᲟᲝ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲓᲔᲑᲐ ᲡᲜᲜ-ᲘᲘ-4-80*-ᲘᲡ ᲛᲝᲗᲮᲝᲕᲜᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲐᲓ.

დასახელება ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭაქვინჯის საჯარო სკოლის მეორე კორპუსის სამხელოსნოს შენობის დემონტაჟი		სარა საქართველოს ენერგეტიკის და საწყისებიანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. კოსტავას 3, ზუგდიდი 2100, N1, II სართული საქართველო 2600 ტა (+995 32) 2 200 220, 2 200 333, www.eaea.ge	ნახაზის დასახელება სადემონტაჟო გეგმა სადემონტაჟო სქემა ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია საქართველოს საკონსტრუქციო ორგანიზაციების პროექტი	საქართველოს საკონსტრუქციო ორგანიზაციის წევრი მ. ხრონაშვილი შესრულა ტარიელ სტურუა მასშტაბი 1:800 ნახაზის „ᲛᲝ-Ი" წერილი N1 ფურცელი
