საკადასტრო გეგმა მ 1:5000

სადემონტაჟო სქემა (საწყობი №1; №2)

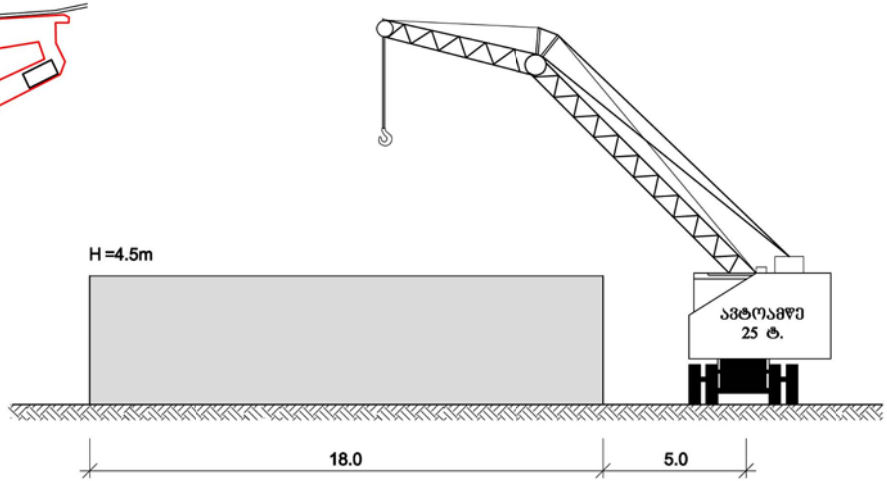

პირობითი აღნიშვნები:

- კოლეჯის სადემონტაჟო შენობები (01;02;
- კოლეჯის არასადემონტაჟო შენობა (03)
- ღია სასაწყობო მოედანი
- დროებითი შენობები
- საავტომობილო ამწე
- ამწის სვლის ლერძი
- ამწის კიდურა დგომი
- დროებითი ღობე
- სახიფათო ზონის საზღვარი

სადემონტაჟო გენგეგმა (სქემატური)

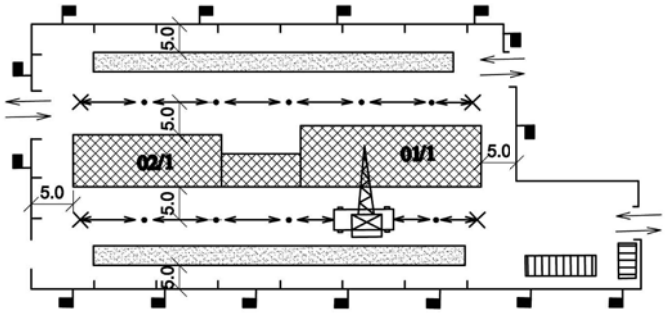

შენიშვნები:

1. წინამდებარე ნახაზი „მო-1“ იხილეთ განმარტებით ბარათთან ერთად.
2. წინამდებარე სადემონტაჟო გენგეგმა დამუშავებულია კოლეჯის სადემონტაჟო შენობების მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟის პერიოდისათვის.
3. შენობების დემონტაჟი ხორციელდება საავტომობილო ამწის (ტვირთ-ამწეობით 25 ტნ) დახმარებით, სამუშაოთა წარმოებისას ამწე მოძრაობს შენობის გარეთა მხრიდან, კონტურის გასწვრივ, მიბმით შენობასთან 5 მეტრამდე და ასევე შენობის შიგნით, ბრძივ და განივ მალებში.
4. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები მოცემულია განმარტებით ბარათში.
5. დემონტაჟის სახიფათო ზონების საზღვრები დაზუსტდეს ადგილზე.
6. სახიფათო ზონის დროებითი მავრთულბადის ღობით შემოფარგვლის საკითხი დაზუსტდეს ადგილზე.
7. სადემონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგიური რიგობრიობა მოცემულია სამუშა-ოთა წარმოების კალენდარულ გეგმაში.
8. ყველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სნდაწ-III-4-80*-ის მოთხოვ-ნების შესაბამისად.
9. სქემატურ სადემონტაჟო გენგეგმაზე ნაჩვენებია მხოლოდ ამწის შენობების გარედან მოძრაობის სქემა.

ობიექტის დასახელება ქ. ახალციხის სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი"-ს №1 სახელოსნოს, სახელოსნოს და საწყობის შენობების დემონტაჟი		სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის I. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება **სადემონტაჟო გენგეგმა (სქემატური)** **სადემონტაჟო სქემა**	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფრ მ. ჭონიაშვილი შეასრულა ტერიელ სტურუა
			ნახაზის სტატუსი **ტექნიკური დოკუმენტაცია** **სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი**	მასშტაბი
				ნახაზი „მო-1“ ფურც. №1 სულ ფურც. 1 სტატუსი რევი
