



მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრი ს. რუხში

გგანახლების ორგანიზაციის ჯგუფი

სადამონტაჟო სამუშაოები

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a long, horizontal, slightly wavy line.

ქ. თბილისი 20156

შინაარსი

ა/ განმარტებითი ბარათი

ბ/ კალენდარული გეგმა

გ/ გრაფიკული ნაწილი:

სამშენებლო გეგმები მო-1;

სადემონტაჟო სქემა მო-2

ა) განმარტებითი ბარათი

1 სამშენებლო ტერიტორიაზე, რუხში, განლაგებულია 5 სადემონტაჟო შენობა—ნაგებობა:

-№12---დაუმთავრებელი 5 სართულიანი შენობის კარკასი

-№13---საძირკვლის ტიპის ნაგებობა;

-№14---საძირკვლის ტიპის ნაგებობა;

-№15---ძველი აუზი;

-№16---მონუმენტი.

2 სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს უცხო ხალხის გაყვანა სადემონტაჟო უბნიდან, სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიიდან და შიდა სივრციდან /№12-ის შემთხვევაში/, გარე და შიგა ქსელების გამორთვა /არსებობის შემთხვევაში /, დროებითი შენობების დაყენება თავისუფალ ტერიტორიაზე ჯგუფურად /გადაადგილება მოხდეს მეორე რიგის დაწყებამდე/, დროებითი ღობის დაყენება, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით არსებული სოფლის ქსელებიდან, აქტის შედგენა მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების შესახებ.

3 სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვევით სათანადო კომისიის დასწრებით ორ რიგად.

პირველი რიგი-----№№12,13,14

მეორე რიგი-----№№16,15

აკრძალულია: სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება ორი-სამი კონსტრუქციების ერთად!

სამუშაოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული:

ყველა კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება, მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ქამრებით და სათვალეებით, დემონტირებული კონსტრუქციების დროებითი დასაღაგებელი ადგილი, აქტის შედგენა ძირითადი პერიოდის სამუშაოების შესახებ. ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეწყვეტა და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციების გამაგრება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოდობილი სათანადო განათებით ღამის საათებში. სამშენებლო ნაგავი დროულად უნდა იქნას გატანილი.

სადემონტაჟო სამუშაოების პირობები:

პირველი რიგი

№12---ხანგრევი ნაქეხებით და კომპური ამწე KB-160.2 /KB-403/-ით;

№13---ხანგრევი ნაქეხებით /ხელით/;

№14---ხანგრევი ნაქეხებით /ხელით/.

მეორე რიგი

№15---ხანგრევი ნაქეხებით /ხელით/;

№16--- ხანგრევი ნაქეხებით და საავტომობილო ამწე KC-3575A-ით

მექანიზმების სამუშაოების დროს აუცილებლად გათვალისწინდეს:

- სამონტაჟო დიოზინის კიბეების დაყენება მუშებისათვის / კონსტრუქციების მომზადების ადგილებთან /;
- ანაკრები კონსტრუქციების შორის ნაკერების და კვანძების გახსნა დროებითი გამაგრების გათვალისწინებით;
- ანაკრები კონსტრუქციების სამონტაჟო ყუდფების შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწოდება;
- დემონტირებული კონსტრუქციების გადმოტანა და დალაგება სპეციალურ მოედანზე;
- ტრავერსების გამოყენება და მათი პარამეტრების გათვალისწინება ამწის შერჩევის.

4. ვინაიდან მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СНиП 1.04.03-85, ხანგრძლივობა პირობითად მიღებულია სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე.

5. ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ 28 მარტის N62 დადგენილების – “მშენებლობის უსაფრთხოების წესები”-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

6. სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებლად მოხდეს მშენებლობის წარმოების პროექტის დამუშავება სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ.

მანქანა-მექანიზმების უწყისი


N	დასახელება	ერთ. გან.	რ-ბა
1	სამშენებლო ლითონის კიბე ბაქნით	ც	4
2	საკომპრესორო დანადგარი	ც	2
3	სანგრევი ჩაქუნები	ც	4
4	ნიჩაბი	ც	8
5	ელექტროსახურხი	ც	4
6	სპეცტრანსპორტი	ც	4
7	შემდუღებელი აპარატი	ც	4
8	კოშკური ამწე	ც	1
9	საავტომობილო ამწე	ც	1
10	ექსკავატორი /ნაგვის დატვირთვა/	ც	1

**კომპიუტერი ამწე КБк-160.2 -ის
ტექნიკური დახასიათება**


1	ცხრის შვერა/მ/	
	მაქსიმალური-----	30.00
	მაქსიმალური ტვირთამწეობისას-----	16.50
	მინიმალური-----	5.50
2	ტვირთამწეობა/ტნ/	
	მინიმალური-----	4.50
	მაქსიმალური-----	8.00
3	აწევის სიმაღლე/მ/	
	მაქსიმალური შვერისას-----	41.00
	მინიმალური შვერისას-----	57.50
4	ლიანდაგის ზომა /მ/-----	6.00
5	ბაზა /მ/-----	6.00
6	მოსაბრუნებელი ნაწილის ზომა /მ/-----	3.80
7	ამწის მასა /ტნ/-----	80.50

**საავტომობილო ამწე КС-3575А-ის
ტექნიკური დახასიათება**

1	ცხრის სიგრძე-----	15.50მ
2	ცხრის შვერა-----	9.00-20.60მ
3	ტვირთამწეობა-----	0.30-1.50ტნ
4	აწევის სიმაღლე-----	21.50-1.50მ
5	ბატიტელის სიგრძე-----	6.00მ




16



კომპლექტირება:	განმარტება:	პროექტის №:
ა. -	ა. -	1503
ბ. -	ბ. -	ა2
გ. -	გ. -	საპროექტო
დ. -	დ. -	1:200
ე. -	ე. -	3A
ვ. -	ვ. -	13-02-2015

განმარტება:	საპროექტო	ფურცელი №:
საპროექტო	საპროექტო	2.1.13
კომპლექტირება:	განმარტება:	
ა. -	ა. -	
ბ. -	ბ. -	
გ. -	გ. -	
დ. -	დ. -	
ე. -	ე. -	
ვ. -	ვ. -	

TDS

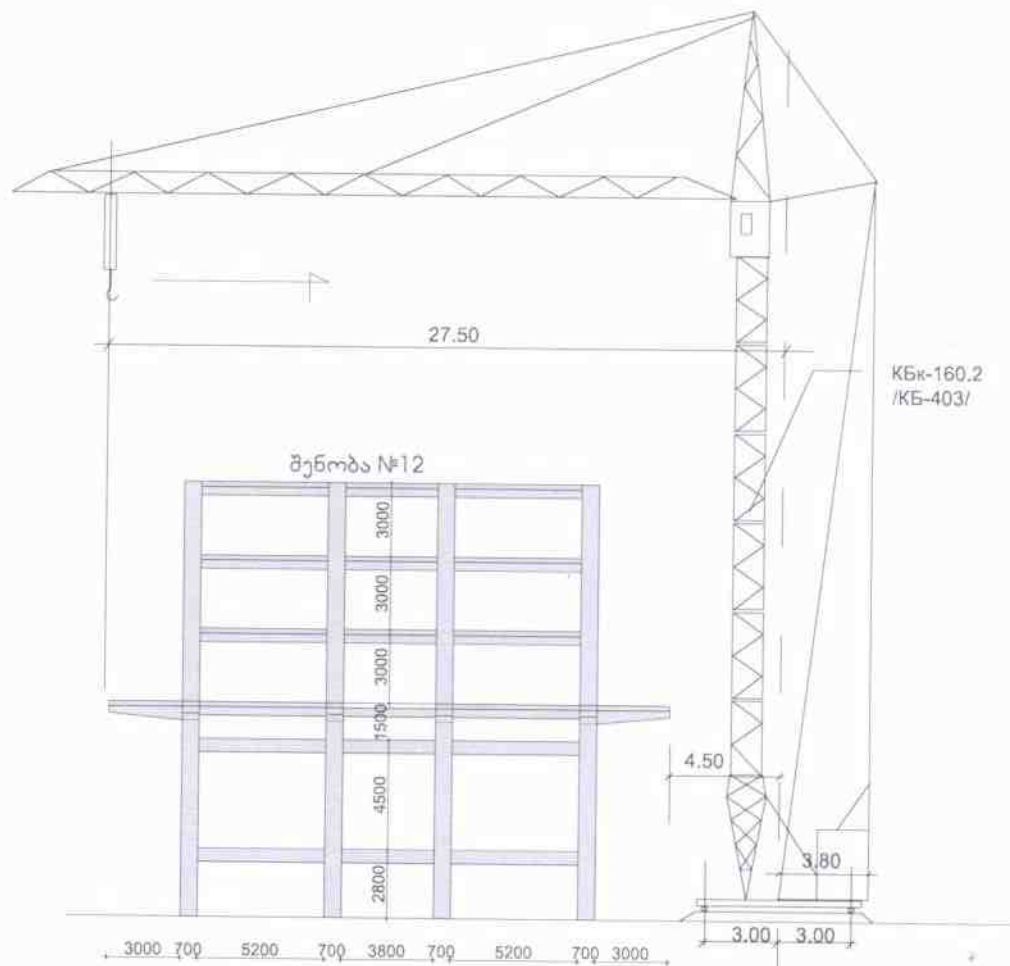

შენიშვნა: სამონტაჟო მექანიზმის მარჯა შეიძლება შეცვლილი იქნას ანალოგიურ მარჯაზე სამშენებლო ორგანიზაციის სურვილის თანახმად

კონსტრუქტორი:	განმარტება:	პროექტი №:
ა.	-	1503
ბ.	-	ზონა:
გ.	-	სტადია:
დ.	-	მასშტაბი:
ე.	-	დახატა:
ვ.	-	თარიღი:

ნაწილი:	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი / სადემონტაჟო პროექტი /	ნაწილი №:
დაამუშავა:	-	მონ-2
პროექტი:	მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრი ს. რაჭა	
პროექტორი:	კილაძე გიორგი	
